



Governo Municipal de  
**ALEXÂNIA**  
A FORÇA DO POVO.

# Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP





## DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

- 41 Ofícios referentes à usucapião enviados pelo juiz para saber do interesse da prefeitura;
- 85 Vistorias relacionadas a invasões de áreas públicas, regularizações de lotes e cadastros de lotes nas comunidades;
- 26 Demarcações para abertura de ruas e fiscalização em obstrução em ruas;



# ATENDIMENTOS NA SECRETARIA

**4.700 Atendimentos**



# PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

- **40 Alvarás de Aceite**
- **74 Alvarás de Construção**
- **80 Certidões de Construção**
- **414 Certidões de Uso do Solo**
- **102 Decretos diversos**
- **67 Habite-se**
- **23 Autorizações**
- **306 Memorandos**
- **73 Ofícios**

TOTAL DE 1.179  
PROCEDIMENTOS  
ADMINISTRATIVOS



# OBRAS PÚBLICAS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

**Obras em execução, concluídas ou paralisadas,  
a saber:**

- Revitalização da Avenida Gabriel Roriz
- Estádio Municipal
- Obra UBS de Olhos D'água
- Quadra coberta - Serra do Ouro



- Creche no Setor Sudeste
- Creche em Olhos D`água
- Ginásio de Esportes
- Lavanderia do Hospital Municipal
- Quadra da Escola Elisabete
- Cobertura da Quadra de Olhos D`água
- UBS Setor Sudeste
- Praça Delcides Machado Lima



# OBRA CONCLUÍDA NO GINÁSIO DE ESPORTES





# OBRA UBS SETOR SUDESTE – Convênio com Ministério da Saúde





Obra UBS Setor Sudeste – Obra iniciada em 03/2017 – Concluída em 05/ 2018 - **Percentual de execução 100,00%**, processos: Licitatório 4146/2016, Acompanhamento de Notas 1481/2017





# HOSPITAL MUNICIPAL - LAVANDERIA

**Obra iniciada em agosto/2017, encontra-se com 70% de execução, conclusão prevista para 08/2018 - Convênio com Ministério da Saúde.**





# HOSPITAL MUNICIPAL - LAVANDERIA

- **Obra iniciada em 08/2017 e conclusão prevista para 08/2018.**





# CRECHE EM OLHOS D'ÁGUA – OBRA EM EXECUÇÃO

**Obra iniciada em 02/2018 previsão de conclusão 12/2018.  
Processos: Licitatório 5558/2015**





# CRECHE EM OLHOS D'ÁGUA – OBRA EM EXECUÇÃO





# CRECHE EM OLHOS D'ÁGUA – OBRA EM EXECUÇÃO





# CRECHE DO SETOR SUDESTE

**Prox. ao Estádio - obra em execução**  
**Previsão de entrega: 08/ 2018**





# CRECHE SETOR SUDESTE





# CRECHE SETOR SUDESTE





# QUADRA COBERTA - SERRA DO OURO

**Obra iniciada em 2013 e paralisada, será licitada no 1º semestre de 2018. A antiga empresa executou em desconformidade e a obra teve que ser paralisada para corrigir os problemas. O contrato com a antiga empresa já foi rescindido e tomada as devidas providências e atualmente está com 65% de execução, paralisada por pendência com FNDE.**





# OBRA UBS DE OLHOS D'ÁGUA

**Obra iniciada em 25/04/2018. Após a antiga empresa ter abandonado a obra. O valor da obra foi atualizado e feita nova licitação. A previsão de entrega é 25/08/2018. Atualmente está com 60% de execução, já está na fase de acabamento. Processo Licitatório: 6867/2017**





# OBRA UBS DE OLHOS D'ÁGUA





# OBRA UBS DE OLHOS D'ÁGUA





# REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GABRIEL RORIZ

- Obra iniciada em 07/2016 e concluída em 05/2018.
- Percentual de execução:100% - aguardando liberação por parte da Caixa Econômica Federal. Processos: Licitatório 2427/2016, Acompanhamento de Notas 3688/2016.





# PROJETOS ELABORADOS





# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**Projeto de Recapeamento Recurso**  
**R\$2.000.000,00: Aguardando a finalização do**  
**convênio com o estado para execução do**  
**asfalto.**



# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO






- Micro revestimento
- Tratamento superficial duplo
- Regularização e compactação sub leito
- Novo asfalto
- Trechos da caixa

LOT. NOVA FLOR  
CHACARAS



# DRENAGEM DA AVENIDA BRASÍLIA

## Aguardando processo licitatório para execução

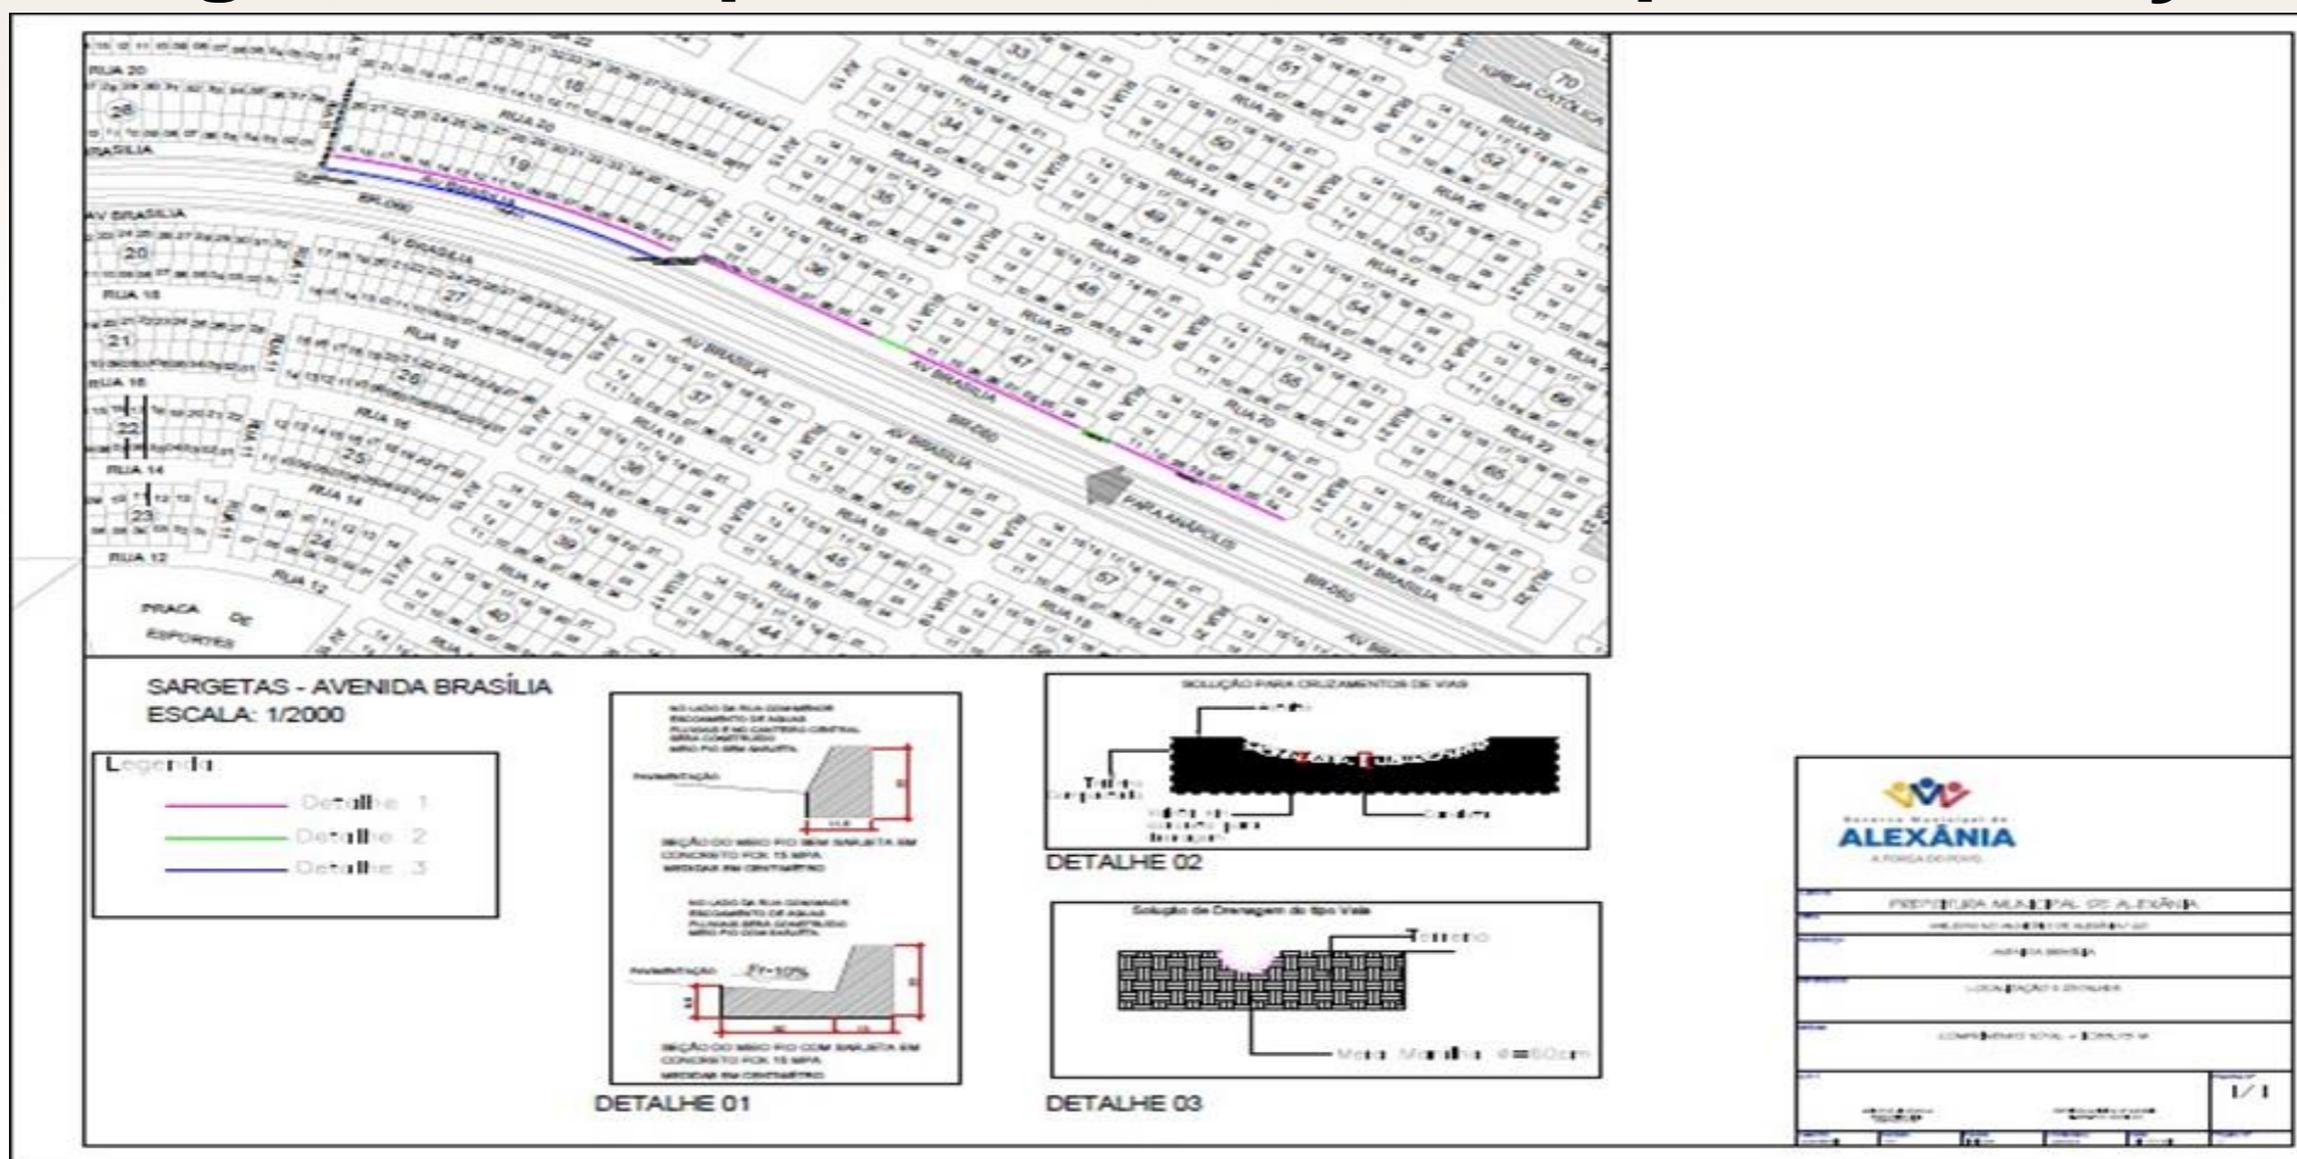



# PROJETO PARA PARADA DE ÔNIBUS E ENTRADA DA MORADA DO SOL





# PARADA DE ÔNIBUS - SERRA DO OURO





# RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE DO CLUBE – Início: 05/04/18, concluído: 09/04/2018





# PROJETOS ELABORADOS

- **Feira do Troca de Olhos D`Água;**
- **Quadra Descoberta;**
- **Ampliação das Escolas;**
- **Arquibancada da Quadra de Olhos D`Água;**
- **Aguas Pluviais da Escola Irenize.**



# SETOR DE OBRAS, REFORMAS E MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS





# CEMITÉRIO MUNICIPAL





# CEMITÉRIO MUNICIPAL

- **Foram feitos 99 sepultamentos no primeiro semestre de 2018;**
- **Foram feitos 2 limpezas gerais;**
- **Foi feita 1 manutenção elétrica.**



# REPAROS E MANUENÇÃO

- **Reforma de pintura paredes e piso do CRAS;**
- **Reparo e reboco do muro da Casa de Passagem;**
- **Reforma e adaptação Escola Onélia (banheiro, mesas e bancos na área de recreação);**
- **Reparo guarita da garagem (construção de fossa, banheiro) e reparo no muro;**



# REPAROS E MANUENÇÃO

- **Reparos e ampliação na sala na Secretaria de Saúde;**
- **Reparo no banheiro do “antigo Thuthucas”;**
- **Reconstrução de parte do muro da Escola José Machado na Alvorada;**
- **Reparos e trocas de portas, alvenaria, pintura e elétrica na Secretaria de Desenvolvimento;**



# REPAROS E MANUENÇÃO

- **Reforma no prédio da PSF da Alvorada;**
- **Reparos no Hospital Municipal (troca de cerâmica (banheiro), pintura(Centro Cirúrgico, troca de lâmpadas);**
- **Abrigo dos Idosos (parte elétrica, banheiro, copa e lavanderia);**
- **Reforma mata-burros (Escola Agrícola e Capitinga);**





# OPERAÇÃO TAPA BURACO





# OPERAÇÃO TAPA BURACO

- **Foi concluída a operação tapa buraco iniciada em 2017.**
- **Foram abertos novos Processos Licitatórios para aquisição de materiais para recuperação asfáltica (tapa buraco) nas ruas que serão recapeadas;**



# RECAPEAMENTO DE RUAS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- **Data de Início/Fim: Sem início;**
- **Percentual de execução 0%;**
- **Processo Licitatório concluído 213/2018, TP  
002/2018;**
- **Obra será iniciada após a execução do  
serviços de tapa buraco;**



# RECAPEAMENTO DE RUAS – GOIÁS NA FRENTE

- **Data Início/Fim; Sem Início;**
- **Percentual de execução: 0%;**
- **Processo Licitatório concluído 2004/2018,  
Concorrência 02/2018;**
- **Obra será iniciada após conclusão do  
serviço de tapa buraco.**



**“Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas.”**

**Ayrton Senna**
